КСС - съгласно Проект за "О-во корабно

ОБЕКТ: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА С ОБХВАТ 1-ВО И 2-РО КОРАБНИ МЕСТА И ЯХТ КЛУБ (0-ВО К.М.) НА ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС"
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА"
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР : "Армоконсулт 2000" ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД „БУРГАС ЯХТ КЛУБ"
ДОГОВОР : № 33 /19.02.2016 г.
О-во корабно място

ном.	име	мярка	по нов проект к-во
	БЕТОНОВА НАСТИЛКА КЕЙ (О-во корабно място)		
1	РАЗБИВАНЕ СТОМАНОБЕТОНОВИ ПЛОЧИ С ЕЛ.КЪРТАЧ	м3	119.00
4	НАПРАВА И ОФОРМЯНЕ ПРИВИДНИ ФУГИ В ПРЯСНО СЪСТОЯНИЕ НА БЕТОНА	100 м.	21.50
5	ЗАЛИВАНЕ ПРИВИДНИ ФУГИ С АСФАЛТОВА СМЕС	100 м.	21.50
нова 7 Ан 1	Подготовка основа, съгласно проекта /водоструене/	м2	6780.00
нова 8 Ан 2	Демонтаж на съществуващи дървени траверси на ръб кей	м	151.00
нова 9 Ан 3	Демонтаж на корозирали стоманени тръби на ръб кей	м	53.50
нова 10 Ан 4	Предварителна обработка на обрушени части кейова стена - изкъртване изветрели части бетон по ръб и под него	м2	180.00
нова 11 Ан 5	Предварителна обработка на обрушени части кейова стена - направа кофраж за подливане на стена и оформяне легло	м2	180.00
нова 12 Ан 6	Подливане бетон за изкърпване на обрушени части кейова стена и оформяне легло на кей ръб вкл. армирана мержа за усилване	м2	180.00
нова 13 Ан 7	Възстановяване на ръб кей, с дървена траверса (вариант 1)	м	151.00
нова 14 Ан 8	Възстановяване на ръб кей, със стоманена 1/4 тръба (вариант 2)	м	53.50
нова 15 Ан 9	Рехабилитация на съществуващ бетон между ръб кей и колектор състояща се в бластриране грундиранем полагане репатриращ слой, повърхностна обработка с одобрена от Възложителя с-ма за саниране на бетонови повърхности (средна дебелина на репатриращия слой 20мм)	м2	460.00
нова 16 Ан 10	Добавка за дебелини над 20мм репатриращ слой за всеки 10мм	м2	200.00
нова 17 Ан 11	Пробиване дупки за свързващи елементи между стар и нов бетон с размери 150/150мм и дълбочина 50мм /по детайл/ за цялата площ	м2	6320.00

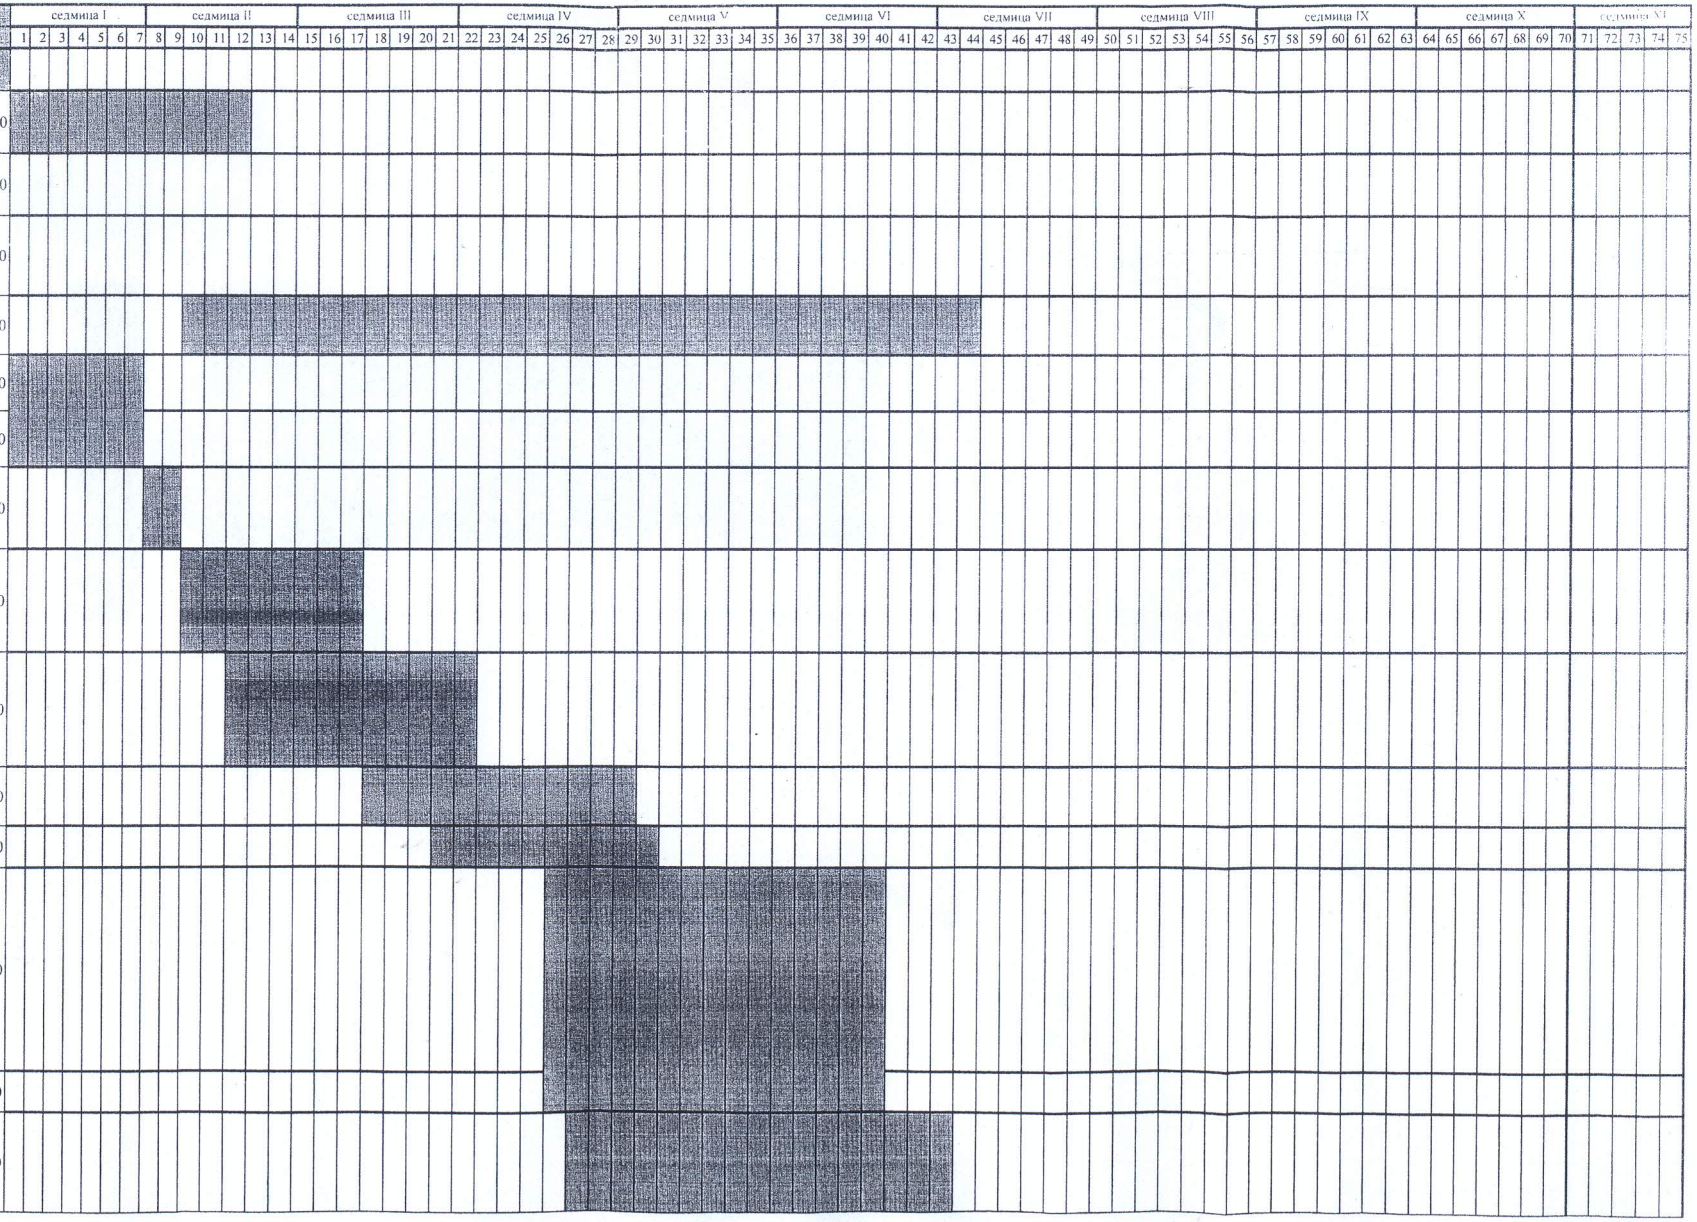

нова 18 Ан 12	Изработка доставка и монтаж на армирана заварена мрежа N6 20x20	кг	16451.00
нова 19 Ан 13	Фиксатори за долна арматурна скара	м2	6320.00
нова 20 Ан 14	Фиксатори за горна арматурна скара /за 1/3 от площа/	м2	2107.00
нова 21 Ан 15	ПОЛАГАНЕ БЕТОН "С30/37" , СУЛФАТОУСТОЙЧИВ съгласно проект (С30/37 XS1, XF3, XA2 XM1 максимален диаметър на инертния материал 20мм, с добавка пролипропиленови нишки 12мм и дисперсна армирока от стаманени фибри)	м3	685.00
нова 22 Ан 16	Полагане на сух повърхностен втвърдител 3-5мм	м2	6320.00
нова 23 Ан 17	Машинна обработка (шлайфане) на бетонова повърхност	м2	6320.00
нова 24 Ан 18	Повърхностна обработка на бетонова повърхност с импрегнатор /завършващ слой/	м2	6320.00
нова 25 Ан 19	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА 50 М НА БЕТОННИ ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ	м3	80.00
нова 26	МЕХАНИЗИРАНО НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА САМОСВАЛ	м3	170.00
нова 27	ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПО	м3	250.00
нова 28	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПРОБЕГ 41до100М - ТАКСА ДЕПО	м3	250.00
нова 29	Повдигане шахти колектор	бр	3.00
нова 30 Ан 20	Бластриране и антикорозионна обработка на метални повърхности видима армировка появила се след разбиване на бетон	м2	988.00
	ПОЛИВНА СИСТЕМА		
	МАРКИРОВКА - ПЪРВА ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА - ПЕШЕХОДНИ ПЪТЕКИ, СТРЕЛКИ, СТОПЛИНИИ И ДРУГИ		
